DEPARTEMENT DE L'ALLIER



ARRONDISSEMENT **DE VICHY**

EXTRAIT DU REGISTRE DES **DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE**

Nombre de Membres :

En exercice: 45

Présents: 34

Votants: 35 (dont 1 procuration)

Nº 8

OBJET:

AMENAGEMENT DE LA RIVE DU LAC D'ALLIER, DE LA **BOUCLE DES ISLES** AU PONT DE L'EUROPE ET **CURAGE DU LAC** D'ALLIER

AVENANT N°1 AU MARCHE DE **TRAVAUX** LOT Nº6 SERRURERIE

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

7 8 SEP. 2020 Publiée ou notifiée

2 8 SEP. 2020

Séance du 17 Septembre 2020

Le Bureau Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - J. KUCHNA - M. CHARASSE - F. SENNEPIN - N. COULANGE - M. MARIEN - N. CHAMOUX BOUILLON - M. MORGAND - B. AGUIAR - C. BENOIT - JC. BRAT, Vice-Présidents.

Mmes et MM, R. LOPEZ – J. TERRACOL – E. BARGE – P. SEROR – L. DUFRAISE - F. GONZALES - T. LAPLACE - B. BAYLAUCQ - JF. CHAUFFRIAS - JM. BOUREL - A. GIRAUD - S. THOMAS-MOLLON – JP. RAYMOND – V. TRIBOULET – R. DEJEAN - S. MORIER-MIZOULE - J. BLETTERY - S. BRUNO - C. BOUARD - P. BONNET -J. ALMAZAN, Conseillers Délégués, Membres formant la majorité des membres en exercice.

Absent ayant donné procuration:

Mme Christine MAGNAUD à M. Romain DEJEAN

Absents excusés :

M. C. BARDOT - JM. GERMANANGUE, Vice-Présidents Mmes et MM. F. SZYPULA - O. ROYER - P. COLAS - T. WIRTH - A. CORNE- JD. BARRAUD - C. DUMONT - E. VOITELLIER, Conseillers Délégués -

Secrétaire: M. Jean-Claude BRAT, Conseiller Communautaire.

Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu l'arrêté préfectoral n°2017/667 du 27 Décembre 2017 portant adoption des nouveaux statuts de la Communauté d' Agglomération de Vichy Communauté à compter du 1° janvier 2018,

Vu la délibération n°2C du 17 septembre 2015 portant approbation par le Bureau Communautaire d'une convention constitutive d'un groupement de commandes avec les communes de Bellerive-sur-Allier et de Vichy pour la sélection d'une équipe de maîtrise d'œuvre en vue de l'aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des Têtes de Pont,

Vu l'accord-cadre A02015-16 du 5 janvier 2016 et le marché subséquent n°1 conclu avec le groupement de maîtrise d'œuvre AXE SAONE (mandataire)/ ARTELIA Ville et Transport/CITEC INGENIEURS CONSEIL/CABINETALLIANCES/BIOTEC/ADEQUATION, représenté par le mandataire AXE SAONE, pour l'aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des Têtes de Pont et la réalisation de 7 avant-projets,

Vu la délibération n°3 du Bureau Communautaire du 1^{er} juin 2017 approuvant l'avenant N°1 à la convention constitutive du groupement de commande,

Vu la délibération n°3A du Bureau Communautaire du 14 septembre 2017 approuvant le marché subséquent n°2,

Vu les délibérations n°39 A et 39 B du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant le programme d'aménagement et de rénovation de la rive gauche de l'Allier entre la boucle des Isles et le pont de l'Europe et tirant le bilan de la concertation préalable,

Vu la délibération n°1 du Bureau Communautaire du 2 novembre 2017 désignant les membres de la CAO de groupement,

Vu la délibération n°5 du Bureau Communautaire du 8 février 2018 approuvant le plan de financement prévisionnel de l'opération,

Vu la délibération b°7 du Bureau Communautaire du 28 juin 2018 autorisant la signature du marché n°18WC08206 – opération de réaménagement de la rive gauche du lac d'Allier , de la Boucle des Isles au pont de l'Europe , et curage du lac d'Allier – lot 6 Serrurerie, pour un montant s'élevant à 1 378 010.00 € HT soit 1 653 612.00 € TTC, conformément à la commission d'appel d'offre du 27 juin 2018,

Considérant que les adaptations de travaux en phase opérationnelle ainsi que les ajustements liés à leur mise en œuvre, nécessitent de procéder à un avenant N°1 pour le marché de travaux du lot 6 à hauteur de $-105\ 028.00\ \in\ HT$ soit $-126\ 033.60\ \in\ TTC$,

Propose au Bureau Communautaire :

- De conclure l'avenant n°1 portant le montant global du marché n° 18WC08206 à 1 272 982.00 € HT soit 1 527 578.40 € TTC (montant initial + avenant),
- D'autoriser M. le Président ou la conseillère déléguée à la Commande publique à signer l'avenant au marché correspondant,

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :

- approuve ces propositions,
- charge M. le Président et M. le directeur général des services de l'exécution et de la publication de ces décisions.

Fait et délibéré, à l'unanimité, en l'hôtel d'agglomération Vichy Communauté, le 17 septembre 2020.

Les membres du Bureau Communaufaire présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédérid AGUILERA



MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)



Vichy Communauté Place de l'hôtel de ville 03200 VICHY

B - Identification du titulaire du marché public.

ID Verde

ZAC du Davayat 03 110 SAINT REMY EN ROLLAT Tél : 04 70 99 08 32 SIRET 339 609 661 01319

C - Identification du maître d'œuvre

AXESAÔNE

17, Quai Fulchiron 69005 LYON Tél: 04 78 38 48 70 SIRET: 411 998 792 00039

D - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Opération de réaménagement de la Rive Gauche de l'Allier, de la boucle des Isles au pont de l'Europe et curage du Lac d'Allier.

Lot n°6: Serrurerie

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

Référence du marché public : 18WC08206

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 04 janvier 2019

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 15 mois ou jours.

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT: 1 378 010.00 € (TF: 1 365 690.00 € + TO1: 12 320.00 €)

Montant TTC: 1 653 612.00 € (TF: 1 653 612.00 € + TO1 : 14 784.00 €)

E - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la promenade en rive gauche, en cours de chantier, des adaptations ont eu lieu entrainant des réajustements des quantités initialement prévues au marché et l'intégration de nouveaux prix.

L'ensemble de ces prestations est répertorié dans les tableaux annexés au présent avenant. Les principales adaptations sont présentées ci-après :

1) Régularisation des OS

Le présent avenant reprend également l'ensemble des prestations des ordres de service listés ci-dessous et notifiés à l'entreprise ld Verde.

os	Objet	Date	Montant
	Fourniture et pose clôture type "OROSOO" de Normaclo en barreaudage	06/05/2019	
3	métallique Ht.150 cm hors sol ou équivalent		339 178,00 €
	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht.200 cm hors sol largeur	06/05/2019	
3			0,00€
	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht 150 cm hors sol largeur	06/05/2019	
3			0,00 €
1	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht 150 cm hors sol largeur	06/05/2019	
3	de passage 1,50 m ou équivalent		1 725,00 €
	Fourniture et pose de portail coulissant OOROSOO largeur 5 ml, hauteur 1,5	06/05/2019	ļ
3			0,00 €
	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht.200 cm hors sol largeur	06/05/2019	
3			3 250,00 €
	Fourniture et pose de portail coulissant BARREAUDE largeur 5 ml, hauteur 1,5	06/05/2019	
3	ml, motorisé		0,00€
3	Fourniture et pose de portillon BARREAUDE largeur 1 ml, hauteur 1,5 ml	06/05/2019	2 200,00 €
	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht.150 cm hors sol largeur	06/05/2019	
3	de passage 4,00m ou équivalent		16 950,00 €
	Fourniture et pose de portail Coulissant BARREAUDE largeur 5 ml, hauteur 1,5	06/05/2019	
3	ml, NON MOTORISE		0,00€
	Fourniture et pose de portail coulissant BARREAUDE largeur 6 ml, hauteur 1,5	06/05/2019	
3	ml, motorisé		9 370,00 €
4	Dépose de la clôture existante en bois	03/10/2019	545,00 €
4 et 6	Fourniture et pose de clôture OOBAMB-3500 MC89 hauteur 1ml	03/10/2019	36 760,50 €
4	Fourniture et pose de portillon OOBAMBOO MC89 largeur 1ml hauteur 1ml	03/10/2019	940,00€
4	Fourniture et pose de portail double battent OOBAMBOO MC89 - Largeur de	03/10/2019	2 100,00 €

***************************************	passage 2,5ml Hauteur 1ml		
6	Dépose clôture existante	10/12/2019	710,00 €
6	Fourniture et pose de tôle peinte d'habillage de rive MARINA	10/12/2019	9 123,50 €
6	Fourniture et pose de tôle peinte d'habillage de rive HIPPO	10/12/2019	550,00 €
6	Platine en inox pour habillage pied de poteau de projeteurs encastrés	10/12/2019	9 300,00 €
6	Grignotage des souches restées suite Orage	10/12/2019	1 200,00 €
9	Fourniture et mise en œuvre barrière automatique	13/05/2020	5 923,00 €
		Total H	T 439.825,00 €

2) Ajustements des quantités + OS en fonction des différents secteurs

Sect	eur Boucle des Isles - Section 1				32.00±0.05				
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRODUIT	QUANTITE	EXE PRODUIT		elta PRODUIT
	LOT TECHNIQUE N°6			WOMPSHIN WINGAMOORILEAL	346 ⁶				
	SERRURERIE			ID Verde		l Evolui	tion projet	l D	elta

	CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE					1 as 20 150 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3,01	Garde corps neuf, conforme à la norme NF P01-012	ml	85,00	306,00	26 010,00 €	665,60	203 673,60 €	580,60	177 663,60 €
3,02	Lisse main-courante metallique sur quai	ml	545,00	249,00	135 705,00 €		0,00€	-545,00	-135 705,00 €
3,08	de Normaclo en barreaudage								
	metallique Ht.200 cm hors sol ou équivalent COMPTABILISE	ml	318,00	220,00	69 960,00 €	32,50	7 150,00 €	-285,50	-62 810,00 €
3,09	Clôture "Marina" en tôle pleine Ht.180 cm hors sol ou équivalent	ml	6,00	512,00	3 072,00 €	0,00	0,00€	-6,00	-3 072,00 €
	CYUTTURE	1111	0,00	. 312,00	3 07 2,00 €	0,00	0,00€	-0,00	3 07 2,00 €
3,11	Portail double vantail en barreaudage type "Rive Gauche" Ht.187 cm hors sol								
	largeur de passage 3,00m ou équivalent	U	2,00	2373,00	4 746,00 €	0,00	0,00€	-2,00	-4 746,00€
3,14	PSE3 : Totem orientatif et informatif Ht hors sol 2,10 x 0,50 m -Type A - NON								
	COMPTABILISE	U	3,00	2650,00	7 950,00 €	0,00	0,00€	-3,00	-7 950,00 €
3,15	PSE4 : Totem orientatif et informatif Ht hors sol 1,08 x 0,50 m -Type B - NON					2000			
	COMPTABILISE	U	3,00	1780,00	5 340,00 €	0,00	0,00€	-3,00 0,00	-5 340,00 €
3,16	PSE5 : Grand Totem orientatif					200000000000000000000000000000000000000	AND COMMENTS OF THE PROPERTY O		
	et informatif Ht hors sol 4,00 x 0,90 m -Type C - NON COMPTABILISE	U	2,00	6160,00	12 320,00 €	0,00	0,00€	-2,00 0.00	-12 320,00 €
	Fourniture et mise en œuvre de "structure-ombrière"	U	4,00	23900,00	95 600,00 €	3,00	71 700,00 €	0,00 -1,00	-23 900,00 €
XE1	0 – Avenant	e trade		18WC0	8206		rational p	'age: 3	/ 11

Total CHAPITRE 3: SERF EN CONSTRUCTION NE				421 487,00 €		343 307,60 €		-78 179,40 €
Secteur Boucle des Isles Section 1 Total CHAPITRE 1: TRAN				35 280,00				
PREPARATOIRES Total CHAPITRE 2: SERR				55 260,00		35 280,00 €		0,00 €
EXISTANTE EN RENOVA Total CHAPITRE 3: SERR EN CONSTRUCTION NE	TION URERIE			0,00 € 421 487,00		0,00€		0,00 € -78 179,40
EN CONSTRUCTION NEC	Total			€ 456 767,00 €		343 307,60 € 378 587,60 €		-78 179,40 €
	TVA			91 353,40 € 548 120,40		75 717,52 €		-15 635,88 € -93 815,28
T.	otal TTC			€		454 305,12 €		€
Fourniture et pose clôtu "OROSOO" de Normaclo barreaudage metallique cm hors sol ou équivaler	en Ht.150	ML	196,00	0,00€	198,50	38 906,00 €	198,50	38 906,00 €
Portail double vantail en barreaudage OROSSOO cm hors sol largeur de pa 4,00m ou équivalent	Ht.150	U	2825,00	0,00€	2,00	5 650,00 €	2,00	5 650,00 €
Total OS				0,00 €		44 556,00 €		44 556,00 €
						423 143,60 €		33 623,40 €

Variation financière totale (ajustements quantité + OS) – Berges section 1 : - 33 623,40 €

30.4652.5	ur Rive Gauche - Entre deux									
ponts	ponts		T .		T					
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRODUIT	QUANTITE	EXE PRODUIT	QUANTITE	Delta PRODUIT	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			
LOT TECHNIQUE N°6 SERRURERIE		······································	454.684	ID Verde		Evolut	ion projet	Delta		
		************		M2000000000000000000000000000000000000						
	CHAPITRE 2: SERRURERIE EXISTANTE EN RENOVATION									
2,01	Décapage et peinture garde- corps existant	ml	40,00	370,00	14 800,00 €	0,00	0,00€	-40,00	-14 800,00 €	
2,02	Câbles inox sur garde-corps existant	ml	120,00	47,00	5 640,00 €	0,00	0,00€	-120,00	-5 640,00€	
	Total CHAPITRE 2: SERRURERIE EXISTANTE EN RENOVATION		777		31 690,00 €		11 250,00 €		-20 440,00 €	
	CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE									
3,01	Garde corps neuf, conforme à	ml	250,00	306,00	76 500,00	244,40	74 786,40 €	-5,60	-1 713,60 €	
EXE1	0 – Avenant			18WC	•		NEW AND DESCRIPTION OF A PROPERTY OF A PROPE		4 / 11	

	la norme NF P01-012				€				
3,08	PSE2: Clôture type "OROSOO" de Normaclo en barreaudage metallique Ht.200 cm hors sol ou équivalent COMPTABILISE Portail double vantail en barreaudage type "Rive	ml	2070,00	220,00	455 400,00 €		171 600,00 €	-1290,00	-283 800,00 €
	Gauche" Ht.187 cm hors sol largeur de passage 3,00m ou équivalent	U	5,00	2373,00	11 865,00 €	· 建 合,在1966年的中国的中国1966年	0,00€	-5,00	-11 865,00 €
3,14	PSE3: Totem orientatif et informatif Ht hors sol 2,10 x 0,50 m -Type A - NON COMPTABILISE	Ü	3,00	2650,00	7 950,00 €	0,00	0,00€	-3,00	-7 950,00 €
3,15	PSE4 : Totem orientatif et informatif Ht hors sol 1,08 x 0,50 m -Type B - NON								9
3,16	COMPTABILISE PSE5 : Grand Totem orientatif et informatif Ht hors sol 4,00 x	U	3,00	1780,00	5 340,00 €.	0,00	0,00€	-3,00 0,0 0	-5 340,00 €
3,17	0,90 m -Type C - NON COMPTABILISE Fourniture et mise en œuvre	U	2,00	6160,00	12 320,00 € 119 500,00	0,00	0,00€	-2,00 0,00	-12 320,00 €
	de "structure-ombrière" Total CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE	U	5,00 (***********************************	23900,00	€ 718 960,00	4,00	95 600,00 € 372 071,40	-1,00	-23 900,00 € -346 888,60
	Secteur Rive Gauche - Entre deux ponts Total CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES Total CHAPITRE 2: SERRURERIE EXISTANTE EN RENOVATION Total CHAPITRE 3: SERRURERIE				34,080,00 € 31,690,00 € 718,960,00		34 080,00 € 11 250,00 € 372 071,40		0,00 € -20 440,00 € -346 888,60
	EN CONSTRUCTION NEUVE Total TVA Total TTC				€ 784 730,00 € 156 946,00 € 941 676,00		€ 417 401,40 € 83 480,28 € 500 881,68		-367 328,60 € -73 465,72 € -440 794,32
				L	A TO PROGRAMMENT				
	Fourniture et pose clôture type "OROSOO" de Normaclo en barreaudage metallique Ht.150 cm hors sol ou équivalent	ML		196,00	0,00€	1290,00	252 840,00 €	1290,00	252 840,00 €
	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht.200 cm hors sol largeur de passage 5,00m ou équivalent	U		3250,00		1,00	3 250,00 €	1,00	3 250,00 €
	Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht.150 cm hors sol largeur de passage 4,00m ou équivalent	U		2825,00	0,00 €	3,00	8 475,00 €	3,00	8 475,00 €
	Dépose de la cloture existante en bois	ML		545,00		1,00	545,00€	1,00	545,00 €

Fourniture et pose de cloture OOBAMBOO MC89 hauteur 1ml	U	189,00	194,50	36 760,50 €	194,50	36 760,50 €
Fourniture et pose de portillon OOBAMBOO MC89 largeur 1ml hauteur 1ml	u	940,00	1,00	940,00€	1,00	940,00€
Fourniture et pose de portail double battend OOBAMBOO MC89 - Largeur de passage 2,5ml Hauteur 1ml	u	2100,00	1,00	2 100,00 €	1,00	2 100,00 €
Dépose cloture existante	U	710,00	1,00	710,00€	1,00	710,00€
Fourniture et pose de tole peinte d'habillage de ríve MARINA		128,50	71,00	9 123,50 €	71,00	9 123,50 €
Fourniture et pose de tole peinte d'habillage de rive HIPPO		550,00	1,00	550,00€	1,00	550,00€
Platine en inox pour habillage pied de poteau de projeteurs encastrés		300,00	31,00	9 300,00 €	31,00	9 300,00€
Grignotage des souches restées suite Orage		600,00	2,00	1 200,00 €	2,00	1 200,00 €
Fourniture barrière automatique		5923,00	1,00	5 923,00 €	1,00	5 923,00 €
Total OS		0,0	00€	331 717,00 €		331 717,00 €
				749 118,40 £		-35 611,60 €

\succ Variation financière totale (ajustement quantités + OS) − Rive gauche entre deux ponts : -35 611,60 \in

			10000						
Secte	eur Confluence Sarmon								
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	Ü	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRODUIT	I QUANTITE	XE PRODUIT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lta PRODUIT
***************************************	And the second s	Ma.	d-composement control of the control	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				<u> </u>	
	LOT TECHNIQUE N°6 SERRURERIE			ID Verde		Evoluti	on projet	De	lta
Samulaesen k									
	CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE								
3,15	PSE4: Totem orientatif et informatif Ht hors sol 1,08 x 0,50 m -Type B - NON COMPTABILISE	U	1,00	1780,00	1 780,00€	0,00	0,00€	-1,00	-1 780,00 €
	Total CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE				17 080,00 €		15 300,00€	0,00	-1 780,00€
	Secteur Confluence Sarmon	oksitesi			and the second				
,	Total CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES				0,00 €		0,00€		0,00€
	Total CHAPITRE 2: SERRURERIE EXISTANTE EN RENOVATION Total CHAPITRE 3: SERRURERIE				0,00 € 17 080,00		0,00€		0,00€
	EN CONSTRUCTION NEUVE				€		15 300,00 €		-1 780,00 €
XE1	0 – Avenant			18WC0	8206			Page: 6	1 11

Total TVA	17 080,00 € 3 416,00 € 20 496,00	15 300,00 € 3 060,00 €	-1 780,00 € -356,00 €
Total TTC	E.	18 360,00 €	-2.136,00 €
Eventure of the control of the contr			
Total OS	0,00 €	0,00€	0,00€
		15 300,00 €	-1 780,00 €

> Variation financière totale (ajustement quantités + OS) — Confluence Sarmon : -1 780,00 €

***********	eur Desserte interne - Section 1		T T	T					
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	υ	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRODUIT	QUANTITE	PRODUIT	L QUANTITE	PRODU
**********	LOT TECHNIQUE N°6		ATTA TO THE PARTY OF THE PARTY						
	SERRURERIE			ID Verde		Evoluti	on projet)elta
	OLITO TELE		*****	10 verue	verse	cvoluci	on projet		/GILO
	CHAPITRE 3: SERRURERIE EN								
	CONSTRUCTION NEUVE								1
3,08	PSE2 : Clôture type "OROSOO"								
2,00	de Normacio en barreaudage	1		N.					
	metallique Ht.200 cm hors sol		la,		40,920,00	B 6 (21848)	3400 (S. 60 (S. 6	12(84-45, AF, 2)	3 6 3 5 6
	ou équivalent COMPTABILISE	mí	186,00	220,00	€	0,00	0,00€	-186,00	-40 920,00
,10	Clôture ""GRAMI" en treillis								
	soudé Ht.150 cm hors sol ou			No.	23 146,00		21 868,00		
	équivalent	ml	326,00	71,00	€	308,00	€	-18,00	-1 278,00
,11	Portail double vantail en								
,	barreaudage type "Rive		ANADA JAJA	7					
	Gauche" Ht.187 cm hors sol								
	largeur de passage 3,00m ou équivalent	U	3,00	3377 00	7110005	0,00	0,00€	-3,00	-7 119,00
.*	equivalent		3,00	2373,00	7 119,00 €	0,00	0,00 €	-3,00	-7 119,00
,12	Portail simple vantail en		ý.						
	barreaudage type "Rive								
	Gauche" Ht.187 cm hors sol largeur de passage 1,50m ou								
	équivalent	U	2,00	1669,00	3 338,00 €	0,00	0,00€	-2,00	-3 338,00
2012				salas personales					
14	PSE3 : Totem orientatif et informatif Ht hors sol 2,10 x								
	0,50 m -Type A - NON								
	COMPTABILISE	u	3,00	2650,00	7 950,00 €	0,00	0,00€	-3,00	-7 950,00
				ocisca avak					
16	PSE5 : Grand Totem orientatif et informatif Ht hors sol 4,00 x					450.059.639.069.05			
	0,90 m -Type C - NON				24 640,00				
	COMPTABILISE	U	4,00	6160,00	€	0,00	0,00€	-4,00	-24 640,00
	Tatal CHADITOE 3. CERRISPER				10711200		31.000.00		
İ	Total CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE				107 113,00 €		21 868,00 €		-85 245,00

Total CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES Total CHAPITRE 2: SERRURERIE EXISTANTE EN RENOVATION Total CHAPITRE 3: SERRURERIE EN CONSTRUCTION NEUVE				0,00 € 0,00 € 107 113,00		0,00 € 0,00 € 21 868,00 €	0,() 0,(-85.245,(
Total TVA Total TTC				107 113,00 € 21 422,60 € 128 535,60 €		21 868,00 € 4 373,60 € 26 241,60 €		-85 245,00 -17 049,00 -102 294,0	
Te de la lace	r	·	ı	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					
Fourniture et pose clôture type "OROSOO" de Normaclo en barreaudage metallique Ht.150 cm hors sol ou équivalent	ML		196,00	0,00€	242,00	47 432,00 €	242,00	47 432,00	
Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht 150 cm hors sol largeur de passage 1,50 m ou équivalent	U		1725,00		1,00	1725.00€	1.00	1 725,00	
Fourniture et pose de portillon BARREAUDE largeur 1 ml, hauteur 1,5 ml	U		2200,00		1,00	2 200,00 €	1,00	2 200,00	
Portail double vantail en barreaudage OROSSOO Ht.150 cm hors sol largeur de passage 4,00m ou équivalent	U		2825,00	0,00€	1,00	2,935,00,6			
Fourniture et pose de portail coulissant BARREAUDE largeur 6 ml, hauteur 1,5 ml, motorisé	U		9370,00		1,00	2 825,00 € 9 370,00 €	1,00 1,00	2 825,00 9 370,00	
Total OS				0,00 €		63 552,00 €		63 552,00	
						85 420,00 €		-21 693,00	

➤ Variation financière totale (ajustement quantités + OS) — Desserte interne Section 1 : -21 693,00 €

L'ensemble des adaptations et des travaux complémentaires me modifie en aucun cas les délais pour chacun des secteurs.

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Incidence financière de l'avenant : L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : (Cocher la case correspondante.) NON OUI

3) Synthèse des variations financières

Variations financières :

➤ La tranche optionnelle 1 – Desserte interne Section 2 ne se fera pas – 12 320,00 € H.T

-	Variations	des	quantités	(hors	Prix	Nouveaux): -	532	533,00 € H.T	
---	------------	-----	-----------	-------	------	--------------	-----	--------------	--

Prix nouveaux enregistrés: + 439 825,00 € H.T

4) Montant de l'avenant :

Montant HT: - 105 028,00 €

Taux de la TVA : 20 % soit 21 005,60 €

Montant TTC: - 126 033,60 €

% d'écart introduit par l'avenant : - 7,622 %

5) Nouveau montant du marché public ou de travaux :

Montant HT: 1 272 982,00 €

Taux de la TVA : 20 % soit 254 596,40 €

Montant TTC: 1 527 578,40 €

F - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

^(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)


Α	:	***************************************	,	le	
---	---	---	---	----	--

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. En cas de remise contre récépissé : Le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » A, le Signature du titulaire, En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : (Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) En cas de notification par voie électronique : (Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

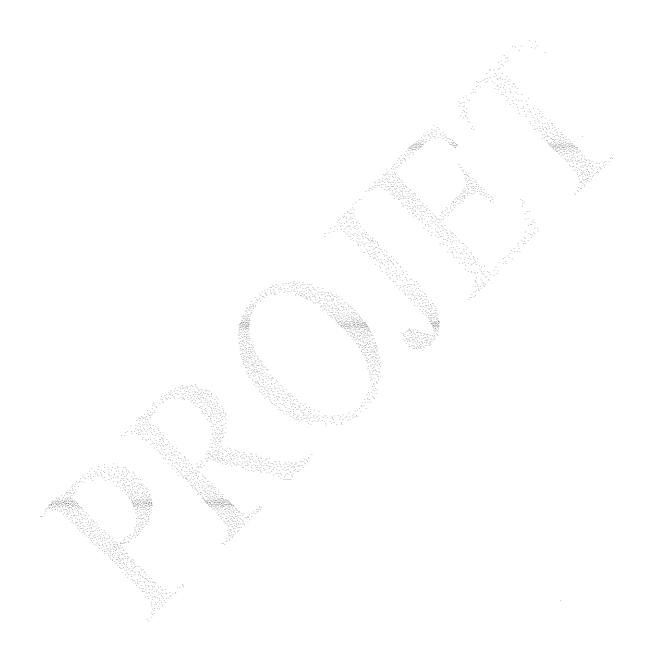

Accusé de réception Page 1 of 1

Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION Nº 8 DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 3 SEPTEMBRE

2020 - MARCHE Nº 17W-077 - COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS

Objet de l'acte : MENAGERS RESIDUELS ET RECYCLABLES ISSUS DE LA COLLECTE EN

PORTE A PORTE SUR LES COMMUNES DE BELLERIVE SUR ALLIER,

CUSSET ET VICHY - AVENANT Nº 1

Date de décision: 03/09/2020

Date de réception de l'accusé 09/09/2020

de réception :

 $oldsymbol{u}_{i}$

Numéro de l'acte: 03SEPT2020_8

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20200903-03SEPT2020_8-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 1 .1

Commande Publique

Marchés publics

Date de la version de la 29/08/2019

classification:

Nom du fichier: 8.pdf (99_DE-003-200071363-20200903-03SEPT2020_8-DE-1-1_1.pdf)
